บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานประจำเดือน: อินเวอร์เตอร์ AC-coupled หยุดทำงาน และข้อมูลจากอินเวอร์เตอร์ไฮบริดบอกเราอย่างไร

Rev01 · 10 พฤศจิกายน 2569 · รายงานประจำเดือน · โซลาร์ 14.19 kWp พร้อมแบตเตอรี่ ไม่ส่งไฟออก (Zero export) · ร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี · ข้อมูล: SolisCloud เมษายน – 10 พฤศจิกายน 2569

อินเวอร์เตอร์หลัก แผงโซลาร์ และแบตเตอรี่**ทำงานได้ดี** แต่**อินเวอร์เตอร์โซลาร์ตัวที่สอง (AC-coupled) หยุดทำงานตอนเที่ยงวันที่ 4 ตุลาคม** และไม่ผลิตไฟอีกเลยตั้งแต่นั้น ร้านเสียไฟฟรีจากโซลาร์ประมาณ **วันละ 12 kWh** (≈ 370 kWh ต่อเดือน) โดยไม่มีใครรู้ เพราะอินเวอร์เตอร์ตัวที่สองไม่มีแอปของตัวเอง

โซลาร์ของอินเวอร์เตอร์หลัก	อินเวอร์เตอร์โซลาร์ตัวที่สอง	ไฟโซลาร์ที่เสียไป
ปกติดี	**หยุดทำงาน**	**≈ 370 kWh**
ตุลาคมผลิตได้ 1,005 kWh ดีที่สุดของปีนี้	ตั้งแต่ 4 ต.ค. เวลา 12:20–12:30	ต่อเดือน ประมาณหนึ่งในสี่ของโซลาร์ทั้งหมด

i อินเวอร์เตอร์แบบ AC-coupled คืออะไร

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด
มีแผงของตัวเอง (DC) + แบตเตอรี่ จ่ายไฟให้ร้าน และส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์

\+


อินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง (AC-coupled)
อินเวอร์เตอร์ออนกริดทั่วไป มีแผงของตัวเอง ต่อเข้าฝั่ง AC

→

มิเตอร์ / CT
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดวัดไฟจากตัวที่สอง และแสดงเป็น "AC Coupled"

การต่อแบบ AC-coupled ช่วยเพิ่มโซลาร์ให้ระบบไฮบริดโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเดิม ข้อควรระวัง: อินเวอร์เตอร์ตัวที่สองมักไม่มีแอปของตัวเอง ถ้าหยุดทำงานจะไม่มีใครรู้ ค่า "AC Coupled" ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเป็นทางเดียวที่จะเห็น


1 ไฟที่ผลิตจากโซลาร์รายเดือน

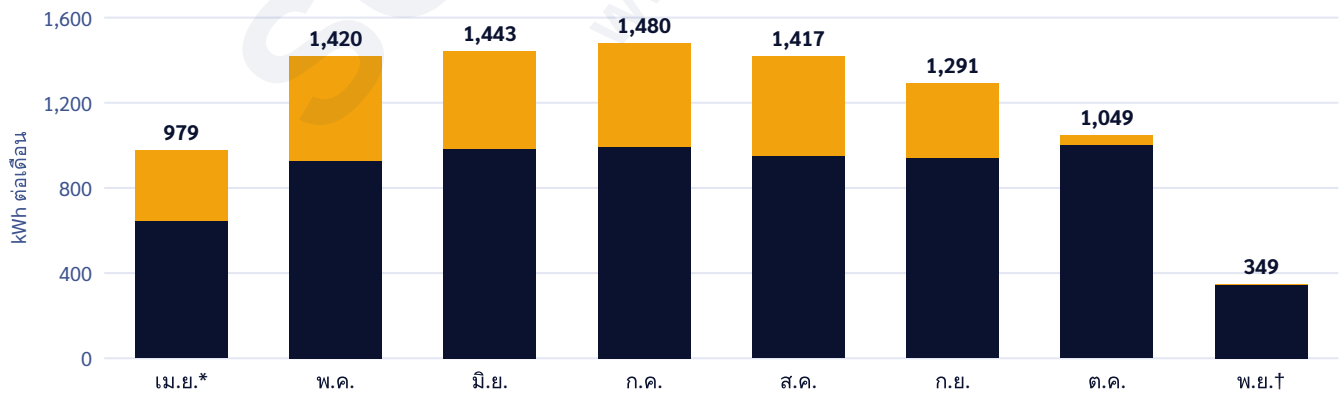

* เมษายน เริ่ม 8 เม.ย. (เริ่มติดตามข้อมูล) † พฤศจิกายน เฉพาะ 1–10 พ.ย. ส่วนสีส้มหายไปตั้งแต่เดือนตุลาคม


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2 อินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง รายวัน

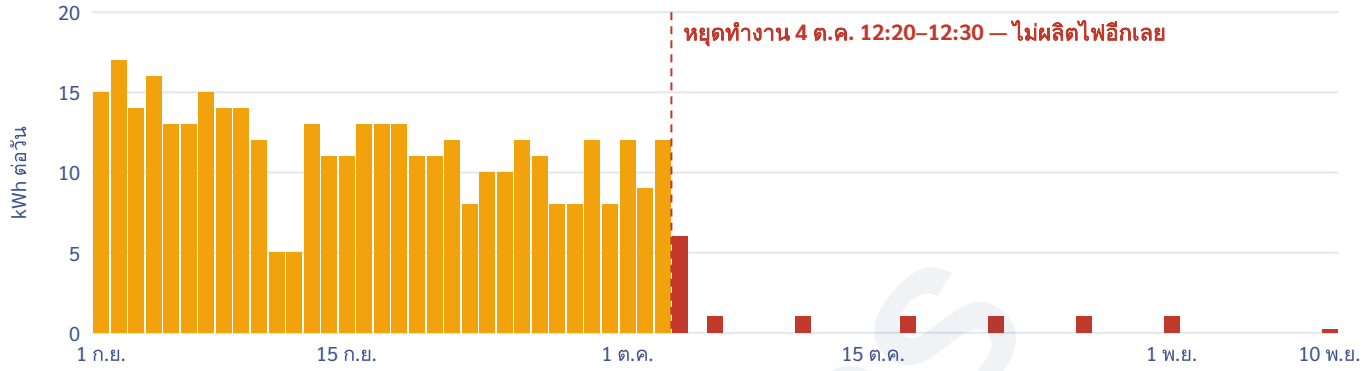

ไฟที่ผลิตได้รายวันของอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง (AC-coupled) 1 ก.ย. – 10 พ.ย. 2569 วันปกติผลิตได้ 8–17 kWh และไม่ผลิตเลยหลังวันที่ 4 ตุลาคม

3 ช่วงเวลาที่หยุดทำงาน

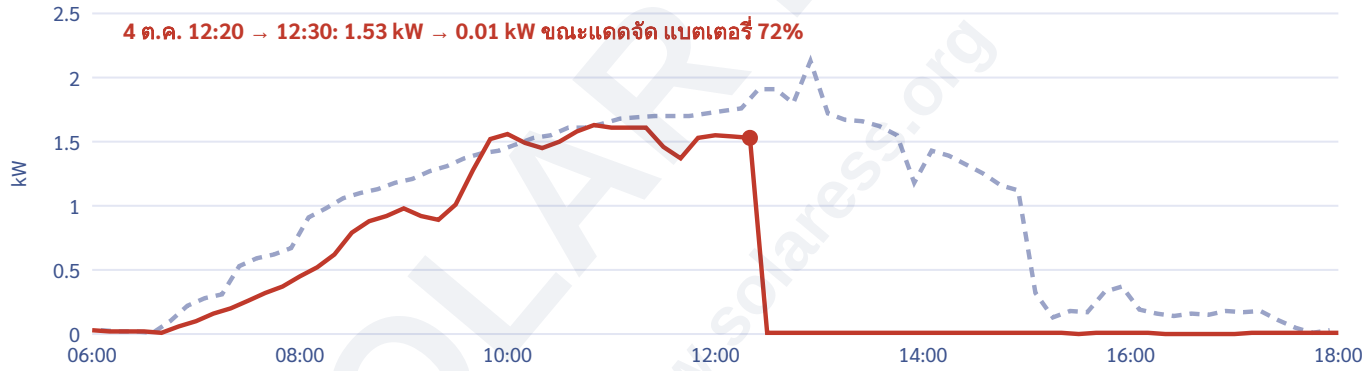

3 ต.ค. วันปกติ (เส้นประ) 4 ต.ค. วันที่หยุดทำงาน

กำลังไฟราย 5 นาทีของอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง หยุดทันทีขณะแดดจัด และแบตเตอรี่ยังไม่เต็ม Solis hybrid ไม่ได้เป็นตัวสั่งหยุด และมิเตอร์ยังส่งข้อมูลอยู่ (ค่าคงที่ ≈ 10 W) แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ตัวที่สองหยุดเอง: เบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดตอนทริป มีความผิดพลาดค้างอยู่ หรืออินเวอร์เตอร์เสีย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

4 สรุปรายเดือน

เดือน 2569	โซลาร์ตัวหลัก	โซลาร์ตัวที่สอง	โซลาร์รวม	ร้านใช้ไฟ	ซื้อจาก กฟภ.	จากแบตเตอรี่
เม.ย.*	647	332	979	1,298	325	298
พ.ค.	927	493	1,420	1,931	529	398
มิ.ย.	984	459	1,443	1,889	480	383
ก.ค.	992	488	1,480	1,819	429	401
ส.ค.	947	470	1,417	1,901	508	407
ก.ย.	943	348	1,291	1,763	491	369
ต.ค.	1,005	**44**	**1,049**	1,348	327	349
พ.ย.†	348	**1**	350	469	125	111

ทุกตัวเลขเป็น kWh * เริ่ม 8 เมษายน † 1–10 พฤศจิกายน

5 สิ่งที่พบ

#	สิ่งที่พบ	ความหมาย
1	อินเวอร์เตอร์ตัวที่สองหยุดทำงานวันที่ 4 ต.ค.	เสียไฟโซลาร์ประมาณวันละ 12 kWh (≈ 370 kWh ต่อเดือน) โซลาร์รวมเดือนตุลาคมลดลงประมาณหนึ่งในสี่
2	อินเวอร์เตอร์หลักและแผงปกติดี	ผลิตได้ 30–43 kWh ในวันแดดดี วันที่ผลิตได้น้อย เช่น 25 ต.ค. และ 8 พ.ย. ตรงกับวันฝนตก
3	แบตเตอรี่ทำงานดี	ชาร์จประมาณ 14 kWh และจ่ายคืนประมาณ 13 kWh เกือบทุกวัน วันแดดดีใช้งานเต็มรอบ
4	ร้านใช้ไฟน้อยลงตั้งแต่ตุลาคม	ประมาณวันละ 45 kWh จากเดิมประมาณ 60 kWh น่าจะเป็นช่วงหน้าฝนที่ลูกค้าน้อย กรุณายืนยันว่าเวลาเปิดร้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
5	มีไฟโซลาร์เหลือช่วงบ่ายวันแดดดี	เมื่อแบตเตอรี่เต็ม (≈ 14:00–14:30) Solis จะลดกำลังผลิตจาก ≈ 4.7 เหลือ ≈ 2.5 kW เพราะไม่ส่งไฟออก ถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลัง 14:00 จะได้ใช้ไฟส่วนนี้ฟรี

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

6 สิ่งที่ต้องตรวจที่หน้างาน (ประมาณ 5 นาที) — ใช้ได้กับทุกระบบ AC-coupled

1. **หาอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง** เป็นกล่องแยกจาก Solis มักอยู่ใกล้ตู้ไฟหลักหรือใต้หลังคา
2. **ถ่ายรูป**หน้าจอหรือไฟแสดงสถานะ และป้ายของเครื่อง (ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง)
3. **ตรวจเบรกเกอร์ AC** ในตู้ไฟ และ**สวิตช์ตัดตอน DC** ถ่ายรูปสวิตช์ที่อยู่ในตำแหน่งปิด
4. **ถ้าหน้าจอแสดงความผิดพลาด ให้รีสตาร์ท:** ปิดเบรกเกอร์ AC แล้วปิดสวิตช์ DC รอ 5 นาที เปิดสวิตช์ DC แล้วเปิดเบรกเกอร์ AC
5. **ส่งรูปให้ Solar ESS** ทาง LINE (solaress1) เราจะตรวจบนระบบติดตามในวันแดดดีถัดไปว่าค่า "AC Coupled" กลับมาแล้ว

ถ้าทริปอีกหรือไม่มีไฟแสดงสถานะเลย Solar ESS จะนัดเข้าตรวจหน้างาน เมื่อได้รูปป้ายเครื่อง เราจะหาแอปติดตามของยี่ห้อนั้น หรือวางแผนซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่อง

ความปลอดภัย: ปิดเฉพาะเบรกเกอร์และสวิตช์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ห้ามเปิดฝาอินเวอร์เตอร์หรือจับสายไฟ ถ้ามีร่องรอยไหม้หรือกลิ่นไหม้ ให้ปิดไว้และโทรหาเรา

Solar ESS Working Group

SOLAR ESS
www.solaress.org
