
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


# บ้าน H1 เชียงใหม่


แก้ไขทันที

**ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2026**

| 5.55 kWp | 0 kWh | 0.00 | 416 kWh | 416 kWh | 0 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW | ผลิตได้ 1–24 ต.ค. | kWh/kWp ต่อวัน | การใช้ไฟ | ซื้อไฟจากการไฟฟ้า | ขายไฟออก |

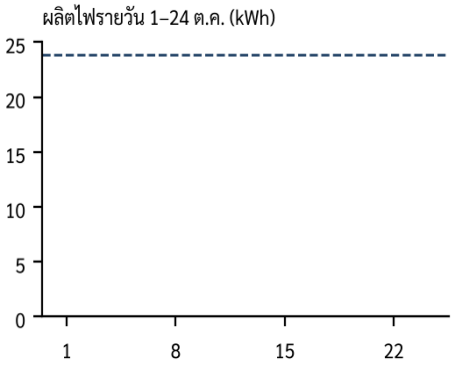

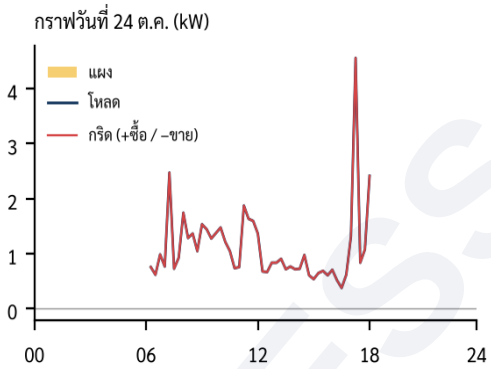

## สิ่งที่พบ

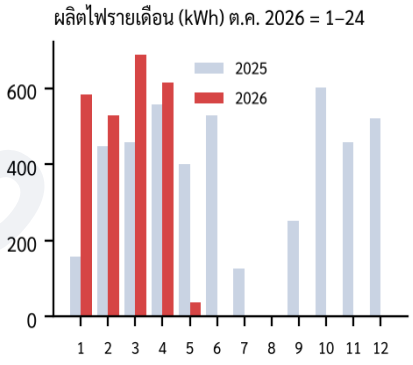- อินเวอร์เตอร์ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2026 เวลา 12:14 น. และยังแจ้งเตือน "Grid Failed" อยู่ ฝั่งกริดอ่านได้ 0 V และ 0 Hz แปลว่าอินเวอร์เตอร์มองไม่เห็นไฟจากการไฟฟ้าเลย
- บ้านซื้อไฟจากการไฟฟ้าทั้งหมด: 416 kWh ในวันที่ 1–24 ตุลาคม และ 360–720 kWh ต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
- ช่วงมกราคม–เมษายน 2026 ระบบผลิตได้ 530–690 kWh ต่อเดือน ตอนนี้เสียพลังงานไปแล้วประมาณ 6 เดือน หรือราว 3,500 kWh

## สิ่งที่ควรทำ

1. เข้าหน้างาน: ตรวจเบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดตอน AC ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับตู้ไฟหลัก แล้วตรวจสาย AC และขั้วต่อที่อินเวอร์เตอร์ สาเหตุที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือเบรกเกอร์ AC ทริปหรือถูกปิดไว้
2. ถ้าเบรกเกอร์ทริปซ้ำ ให้วัดฉนวนสายและตรวจรีเลย์ AC ของอินเวอร์เตอร์ก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง
3. เมื่อระบบกลับมาทำงานแล้ว ให้ตรวจใน FusionSolar ว่าแรงดันกริดประมาณ 230 V และผลิตไฟได้ปกติในวันที่แดดดีวันถัดไป

## เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

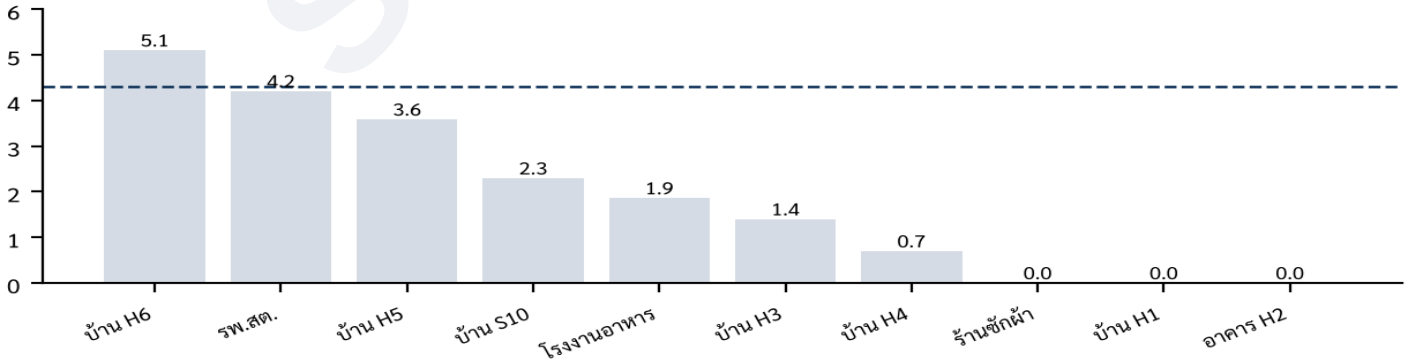


อันดับ 9 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน
