บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

Battery wall job: 2 welds, 1 battery, 1 day

งานติดตั้งแบตเตอรี่ลูกที่ 2: เชื่อม 2 จุด · ติดผนัง · ต่อขนาน

Mueang Ngai, Chiang Dao, Chiang Mai | Solis 6 kW hybrid | 2 × LVTS-51200 = 20.48 kWh | ≈ 1 day

Before → Today → Target ก่อน → วันนี้ → เป้าหมาย



BEFORE One battery · แบต 1 ลูก



TODAY Battery 2 waits on the floor · แบตลูกที่ 2 วางบนพื้น



TARGET Both on the wall · ติดผนังเคียงกัน

The target picture shows the old inverter; the site now has a **Solis 6 kW hybrid**. Everything below the inverter is the same. · ภาพเป้าหมายยังเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเดิม ตอนนี้เป็น Solis 6 kW แล้ว ส่วนอื่นเหมือนเดิม

Who we need ช่างที่ต้องการ

Welder · ช่างเชื่อม
Two clean welds on galvanised steel.

Certified electrician · ช่างไฟฟ้ามีใบรับรอง
Battery paralleling and start-up.

One person can do both · คนเดียวทำได้ทั้งสองงาน
if certified, plus a helper to lift.


Safety first · ความปลอดภัยต้องมาก่อน

- Never weld near a live battery: switch everything off and shield the batteries and cables from sparks.
- Have the fire extinguisher ready during welding.
- Never short + and – of a battery: use insulated tools.

How to apply · วิธีสมัคร: go to **www.solaress.org/job.html** → "Weld 2 points + mount the 2nd battery" → **Quote for this job**. Send your local day rate, earliest start date, photos of similar work and your certificate.

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

What goes where ตำแหน่งงาน

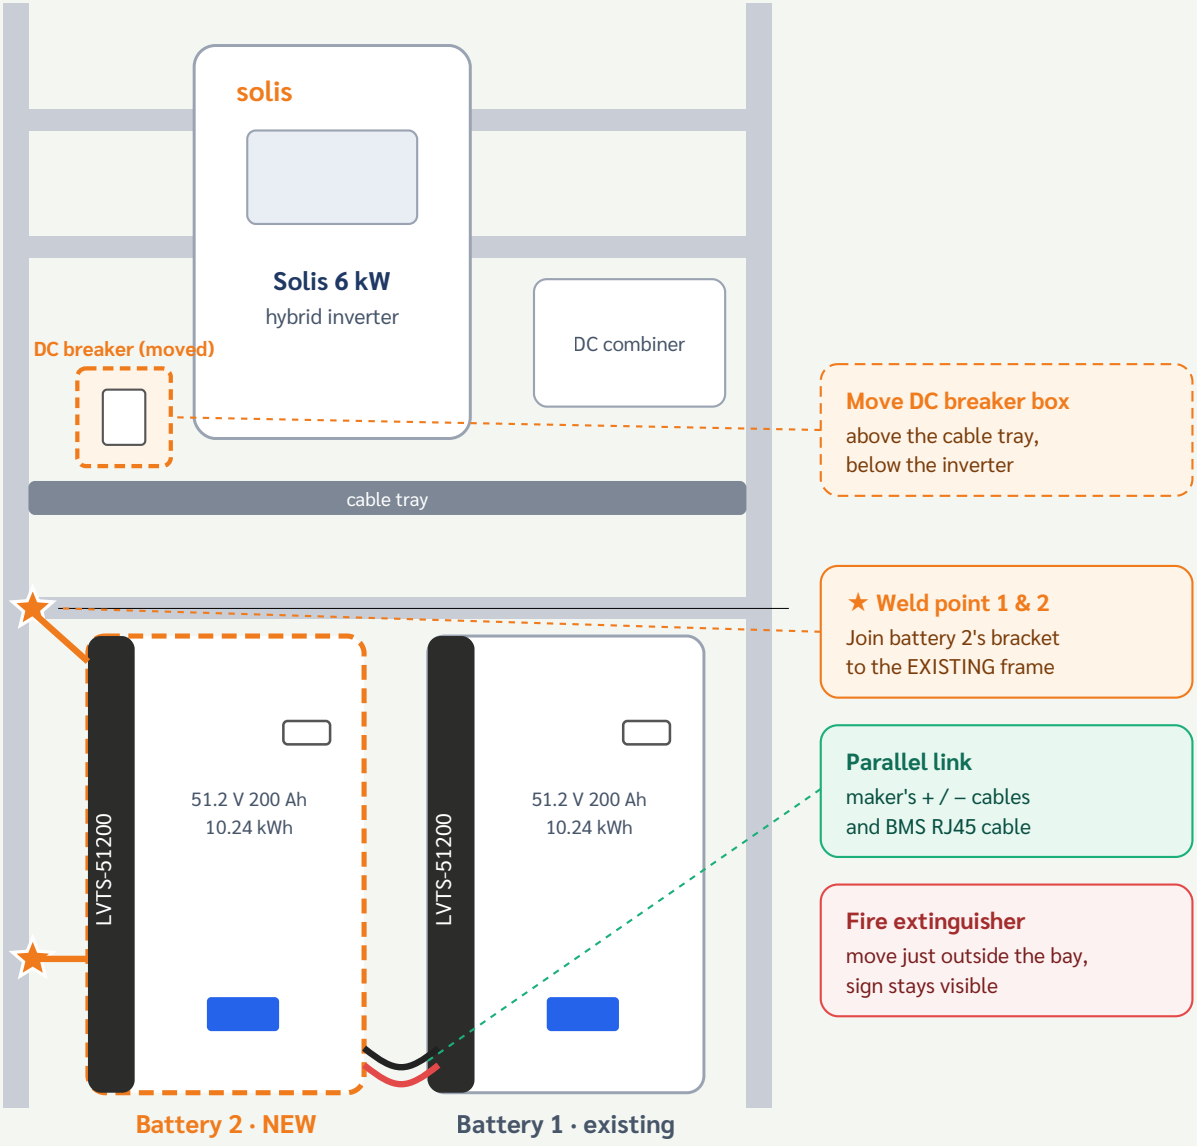

6 easy steps 6 ขั้นตอน

1 Weld 2 points · เชื่อม 2 จุด
Join battery 2's bracket to the existing frame, left of battery 1. Paint both welds against rust. No new structure.

2 Lift & fix battery 2 · ยกแบตขึ้นติด
Heavy: 2 people. Level it and fix it tight, same height as battery 1.

3 Move the boxes · ย้ายตู้
DC breaker box above the cable tray, below the inverter. Fire extinguisher just outside the bay.

4 Switch off, then parallel · ปิดระบบแล้วต่อขนาน
Battery breaker and inverter OFF. Maker's + / – cables and BMS RJ45 cable; set master / slave address.

5 Check, then start · ตรวจแล้วเปิด
Torque terminals, check polarity and voltage. Start up with the Solar ESS team on the phone.

6 Tidy & photos · เก็บงานถ่ายรูป
Cables in the tray, area clean. Photos before, during, after + Solar ESS report form.
