บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1


แก้ไขทันที

บ้าน S10 สงขลา


SolisCloud ไม่บันทึกโซลาร์

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 16 kW 1 เฟส · มีแบต

0	0.00	74%	10.7	30	15.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

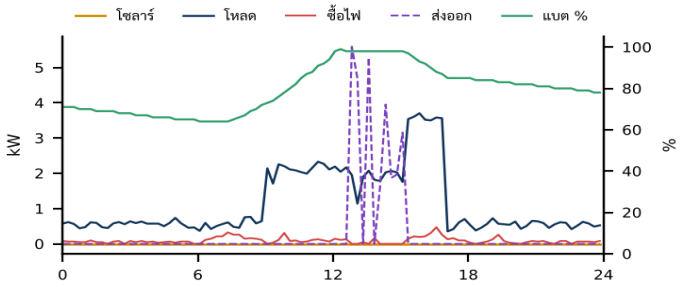

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

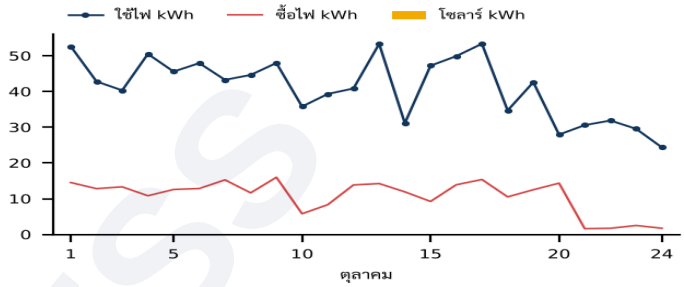

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- SolisCloud แสดงโซลาร์ 0 kWh ทั้งเดือน แต่แบตยังชาร์จ 5 kW ช่วงเที่ยงและมิเตอร์เห็นไฟไหลเข้า
- แผงน่าจะต่ออยู่กับอินเวอร์เตอร์อีกตัว (แสดงบน Huawei FusionSolar ที่ 0 kWp) แบบ AC-coupled กับไฮบริดตัวนี้
- มีสัญญาณเตือนแรงดันแบตสูง (OV-Vbatt) 2 ครั้งในเดือนตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- แก้การตั้งค่าระบบ: บน SolisCloud ระบุว่า 10 kWp เป็น AC-coupled (หรือตั้งกำลังแผงเป็น 0) และใส่ 10 kWp จริงในระบบบน Huawei ให้แต่ละแพลตฟอร์มรายงานถูกต้อง
- ตรวจการตั้งค่าแรงดันชาร์จแบตหลังมีสัญญาณเตือน OV-Vbatt

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

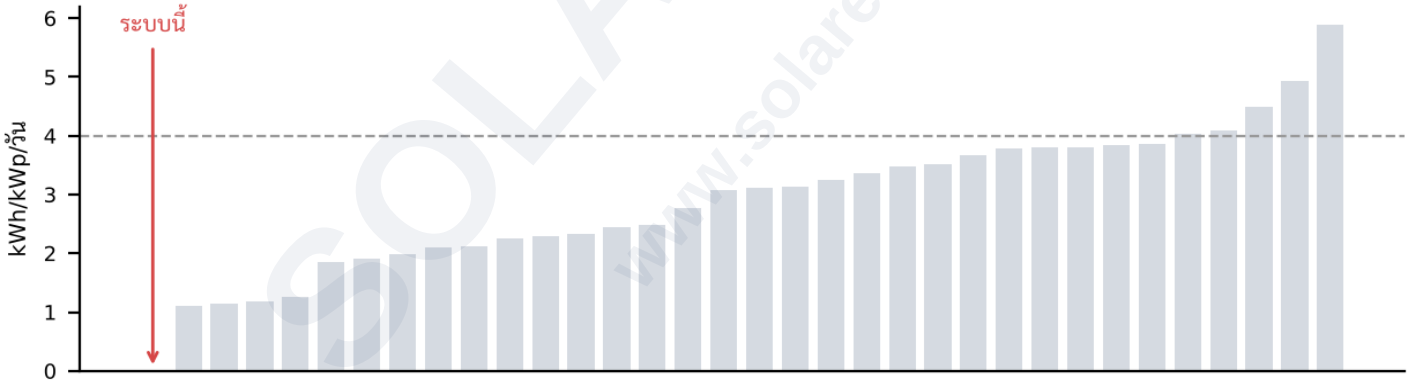

อันดับ 34 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่
